To-Be 業務フロー　BPR レビュー

「 To-Be 業務フロー設計（ 2026/10/30 ・ ABeam ）」に対する BPR 観点の指摘 ―　STEP2 の位置づけで再仕分け

レビューの結論

- システム要件の導出資料としては質が高い。業務フローに機能要件 No. が紐づきトレーサビリティが効き、パターン × 拠点マトリクスで網羅性を担保、係数の本社集中メンテ・拠点メンテ禁止など統制設計も正しい。
- 本日は STEP2 （ To-Be 業務フロー仮説 + 機能要件抽出 + 型の定義）。この位置づけで指摘を再仕分けすると、 11 件中 9 件は STEP2 で有効（うち 6 件は STEP2 自身の明文ゴール = RACI 整理／固有リスク発生箇所を特定できる粒度／型④確定ロック、または本日の討議対象 = 拠点実現性・開示タイムラインに直結）。
- 一方 2 件（工数の定量化・自動化範囲の線引き）は STEP3/4 の領域であり、本日の成果物への指摘としては時期尚早。効果は『仮説』と明示すれば足りる、と格下げした。各指摘に『扱う時期（ STEP2/3-4/5 ）』を付した。

©LION Corporation /　デジタル戦略部

本日は STEP2 ｜指摘の「扱う時期」での再仕分け

STEP2 の成果物に対する指摘か、後続 STEP で扱う論点かを切り分ける

STEP2(本日)	STEP3	STEP4	STEP5
To-Be 業務フロー仮説 機能要件抽出・型の定義	リターン 3 軸の定量評価 （工数 / リスク / 機会）・コスト	機能・自動化範囲の調整 （ Should/Could の取捨）	固有リスクの確定・ キーコントロールの特定

STEP2 で有効｜成果物の芯・自己整合性（◎ 6 件）

- A-1 承認・確定ロックの『工程の箱』がフローに無い（型④・固有リスク発生箇所の粒度と不整合）
- A-2 例外・差戻しの分岐が無い（固有リスク発生箇所を特定できる粒度、という STEP2 ゴールに未達）
- A-3 集計・確定・遡及再計算まで繋がっていない（型④＝確定ロックの自己整合）
- B-1 按分・推計の RACI が未確定（『役割分担が整理されている』 = STEP2 ゴールそのもの）
- B-2 組織階層の型（承認ルート・段数）がフロー未反映（型①の自己整合）

STEP2 で論点提示は妥当｜本日の討議対象（〇 3 件）

- E-1 開示タイムラインの年度末集中（ S27 で『運用可否の意見』を本日依頼）
- E-2 海外拠点の月次クローズ可否（ S7 で『拠点での実現性』を本日討議）
- D-1/D-2 証憑の二重管理・基盤外統制（機能要件レベルで今拾える／統制の確定は STEP5 ）

後続 STEP で扱う｜本日は時期尚早（△ 2 件）

- C-1 工数削減の定量化 → STEP3 （リターン 3 軸の定量評価）。本日は効果を『仮説』と明示すれば可
- C-2 自動化範囲の線引き（自動連携が Should/Could ） → STEP4 （機能・自動化範囲の調整）

総評｜強みと核心課題

活かすべき強みは残し、 STEP2 の『フロー／型』の芯を一段引き上げる

活かすべき強み

✓ **業務フロー→機能要件のトレーサビリティ**
各工程に機能要件 No. （ 4-01 〜 5-21 ）が紐づき、要件の根拠が追える

✓ **パターン × 拠点マトリクスによる網羅性**
7 入力パターン × 拠点分類で収集方式の抜け漏れを防ぐ構造

✓ **保証区分に応じた深度の切り替え**
義務＝詳細／任意＝型を流用／対象外＝簡易、とメリハリが効いている

✓ **係数の分離統制**
本社が係数を一括メンテ・拠点はメンテ不可（ 5-16/5-17 ）＝職務分離が正しい

✓ **係数未紐づけ時の算定・提出ブロック**
5-20 で不完全データの先送りを防ぐ設計

核心課題：描かれているのは「データフロー」

STEP2 が謳う『フロー／型』に必須の 3 要素が欠落（＝自己整合性の問題）

① 承認・確定ロックの『箱』がフローに無い

「証憑入手→登録→算定」で終わり、承認・チェック・確定の工程が無い。型④（確定ロック）・固有リスク発生箇所の粒度という STEP2 ゴールと不整合

② 例外・差戻し（ unhappy path ）が無い

全フローがハッピーパスのみ。固有リスクと工数は例外に宿るため、 STEP2 で発生箇所を特定する目的に対し致命的

③ 集計・確定・遡及まで繋がっていない

型④で確定ロック・遡及再計算を定義しながら、個別フローは「 5. 算定」で終了。 End-to-end が未完成

※ 工数の定量化・自動化範囲の線引きは STEP3/4 で扱う論点のため、本日の核心課題からは除外。

A. プロセス設計の芯（STEP2 で有効・最優先）

STEP2 の型・ゴールに照らして、統制・例外・確定をフローに内包させる

	問題	なぜ問題か（BPR 観点）	打ち手	扱う時期
A-1	**承認・確定ロックの『工程の箱』がフローに無い**	個別フロー（S20 〜 26）は「証憑入手→登録→按分・換算→係数登録 → GHG 算定」で終わり、承認・チェック・確定ロックの箱が一つもない。キーコントロールの『確定』は STEP5 でよいが、型④（確定ロック）と『固有リスク発生箇所を特定できる粒度で描く』という STEP2 の明文ゴールに照らすと、統制を乗せる工程の箱自体が無いのは本日の成果物の不整合。	各フローに「チェック→承認→確定ロック」の工程とレーンを追加し、 STEP5 で統制を乗せる土台をつくる。承認者が参照する画面・判定観点を仮置きする。	**STEP2 ◎**
A-2	**例外・差戻し（unhappy path）が描かれていない**	全フローがハッピーパスのみ。固有リスクと工数は例外（締切超過・係数欠落・ OCR 誤読・検証差戻し）に宿るため、『固有リスクの発生箇所を特定できる粒度』を謳う STEP2 の目的に対して致命的。詳細な SLA は STEP4 でよいが、分岐の有無は STEP2 で必要。	例外パス（差戻し・締切超過・係数欠落・検証指摘）を標準パターンとして 1 本設計し、全区分へ展開。滞留検知・リマインド・代理承認の箱を置く。	**STEP2 ◎**
A-3	**集計・確定・開示・遡及再計算まで繋がっていない**	型④で「確定ロックのタイミングと遡及再計算」を定義（S6）しているのに、個別フローは「 5. 算定」で終了。 6. 集計・確定ロック・開示・遡及再計算が業務フロー化されておらず、型④の自己整合が取れていない。 SSBJ の比較情報で必須の遡及再計算の居場所も無い。	「 6. 集計・確定ロック・開示」と遡及再計算の工程をフロー化し、型④と整合。ロック後の修正は正式な再計算プロセスとして経路を定義する。	**STEP2 ◎**

B. 役割・責任（ RACI ） ／ C. 効果の検証

B は STEP2 ゴールそのもの／ C は後続 STEP で扱う（本日は仮説と明示）

	問題	なぜ問題か（ BPR 観点）	打ち手	扱う時期
B-1	**按分・推計の RACI が未確定（作業が拠点へ移動）**	サマリ（ S18 ）で「 ESG 事務局での按分・推計作業から、入力者での作業 or システム内計算へ」と変更。面積比率按分・標準状態換算・単位換算の判断と根拠管理を拠点側へ移すが、 As-Is 調査では「拠点は計算していない」が基本。しかも「入力者 or システム」と両論併記のまま。 STEP2 のゴール『役割分担（ RACI ）が整理されている』に未達。	按分・推計の RACI を確定（実行＝システム／根拠入力＝拠点／妥当性承認＝本社 等）。自動計算と人の根拠入力を切り分ける。	**STEP2 ◎**
B-2	**組織階層の型（承認ルート・段数）がフロー未反映**	4 つの型の①が組織階層・承認ルート・承認の段数（ S6 ）だが、個別フロー（ S20 〜 26 ）に承認ルート・段数の描写がゼロ。型①の自己整合が取れておらず、拠点→事業部→事務局の多段承認がどの工程で効くか不明。	組織階層の型を各フローの承認工程に落とし込み、拠点分類ごとの承認段数・承認者を明示する。	**STEP2 ◎**
C-1	**「工数削減」が定量化されていない**	S18 で「工数を削減しつつ」と効果を謳うが現状・削減後の数字が無い。ただしリターン 3 軸（工数 / リスク / 機会）の定量評価は STEP3 の成果物であり、本日の成果物への指摘としては時期尚早。現時点の妥当な論点は『効果を断定でなく仮説と明示する』ことのみ。	S18 の効果記述は『仮説』と明示。母数（拠点 × 項目 × 頻度）と手入力件数の定量化は STEP3 で試算式とともに実施する。	**STEP3 △**
C-2	**自動連携（ A ）が Should/Could なのに図で前面に出る**	図では自動連携ボックスが目立つがパターン A は軒並み Should/Could （ S8 ）。ただし自動化範囲の線引きは STEP4 の成果物のため、本日の指摘としては時期尚早。現時点はコミュニケーション上の注意に留まる。	図上で『自動化は条件付き』と注記するに留め、採否の線引きは STEP4 で正式に判断する。	**STEP4 △**


D. 保証・証憑統制 ／ E. 開示タイムライン

E は本日まさに『運用可否・実現性』の意見を求めている対象

	問題	なぜ問題か（BPR 観点）	打ち手	扱う時期
D-1	**証憑が二重管理になっている**	4-12 （証憑をアップロード保持）が Must 、かつ 4-13 （格納先リンク = SharePoint 等）も Must （ EN-1/EN-4 ）。システム内コピーと外部リンクの二つの真正ソースが並立すると、確定ロック後にリンク先が差し替わっても検知できない。機能要件レベルで今拾える論点（統制の確定は STEP5 ）。	ロック時点の正本を一方に一本化。外部リンクを残すならロック時にハッシュ / スナップショットで改変検知できる設計にする。	STEP2 ○
D-2	**基盤外（推計・按分根拠）の統制が外れる**	パターン F/G （ S8 ）で推計・按分の根拠を「基盤外（ SharePoint 等）」で管理。件数が少ない前提は理解できるが、基盤外に出た瞬間に証跡統制の外に出る。型② /③ （証憑保管方法）の設計判断として今整理できる。	基盤外根拠も版管理・ロックの対象に含めるルールを型に定義。可能なら根拠ファイルも基盤に取り込む。	STEP2 ○
E-1	**年度末一括保証に偏り、差戻しバッファが無い**	算定対象（〜 12 月）に対し、サイト検証と全体プロセス検証がともに 2 月に集中（ S27 ）。速報値→役員・取締役会承認 3/15→ 有報開示 3/20 で、検証で誤りが出てからの差戻し・再算定の余白がほぼゼロ。資料自身の注記『他社は 3Q 分を前倒し検証』はこのリスクの裏返し。本日『運用可否の意見』を求めている対象。	インテリム（ 3Q 分前倒し）検証を前提に組み替え、年度末は 4Q 差分のみに圧縮。差戻しバッファを明示的に確保する。	STEP2 ○
E-2	**海外拠点の月次クローズ可否が未確認**	11 月データを 1/10 拠点承認 = 月次締めを海外拠点（バングラデシュ等）にも課す設計だが、海外の月次収集・言語・入力者の実在性がフロー / タイムラインに表れていない。本日『拠点での実現性』を討議する対象（ S7 ）。	海外拠点の月次クローズ実現性を拠点分類別に確認。困難な拠点は四半期クローズ等、現地実態に合わせた収集サイクルを設計する。	STEP2 ○

打ち手の中核｜業務フローの「型」の引き上げ（A-1～A-3）

登録中心のデータフロー → 統制・例外・確定を内包した業務プロセスへ

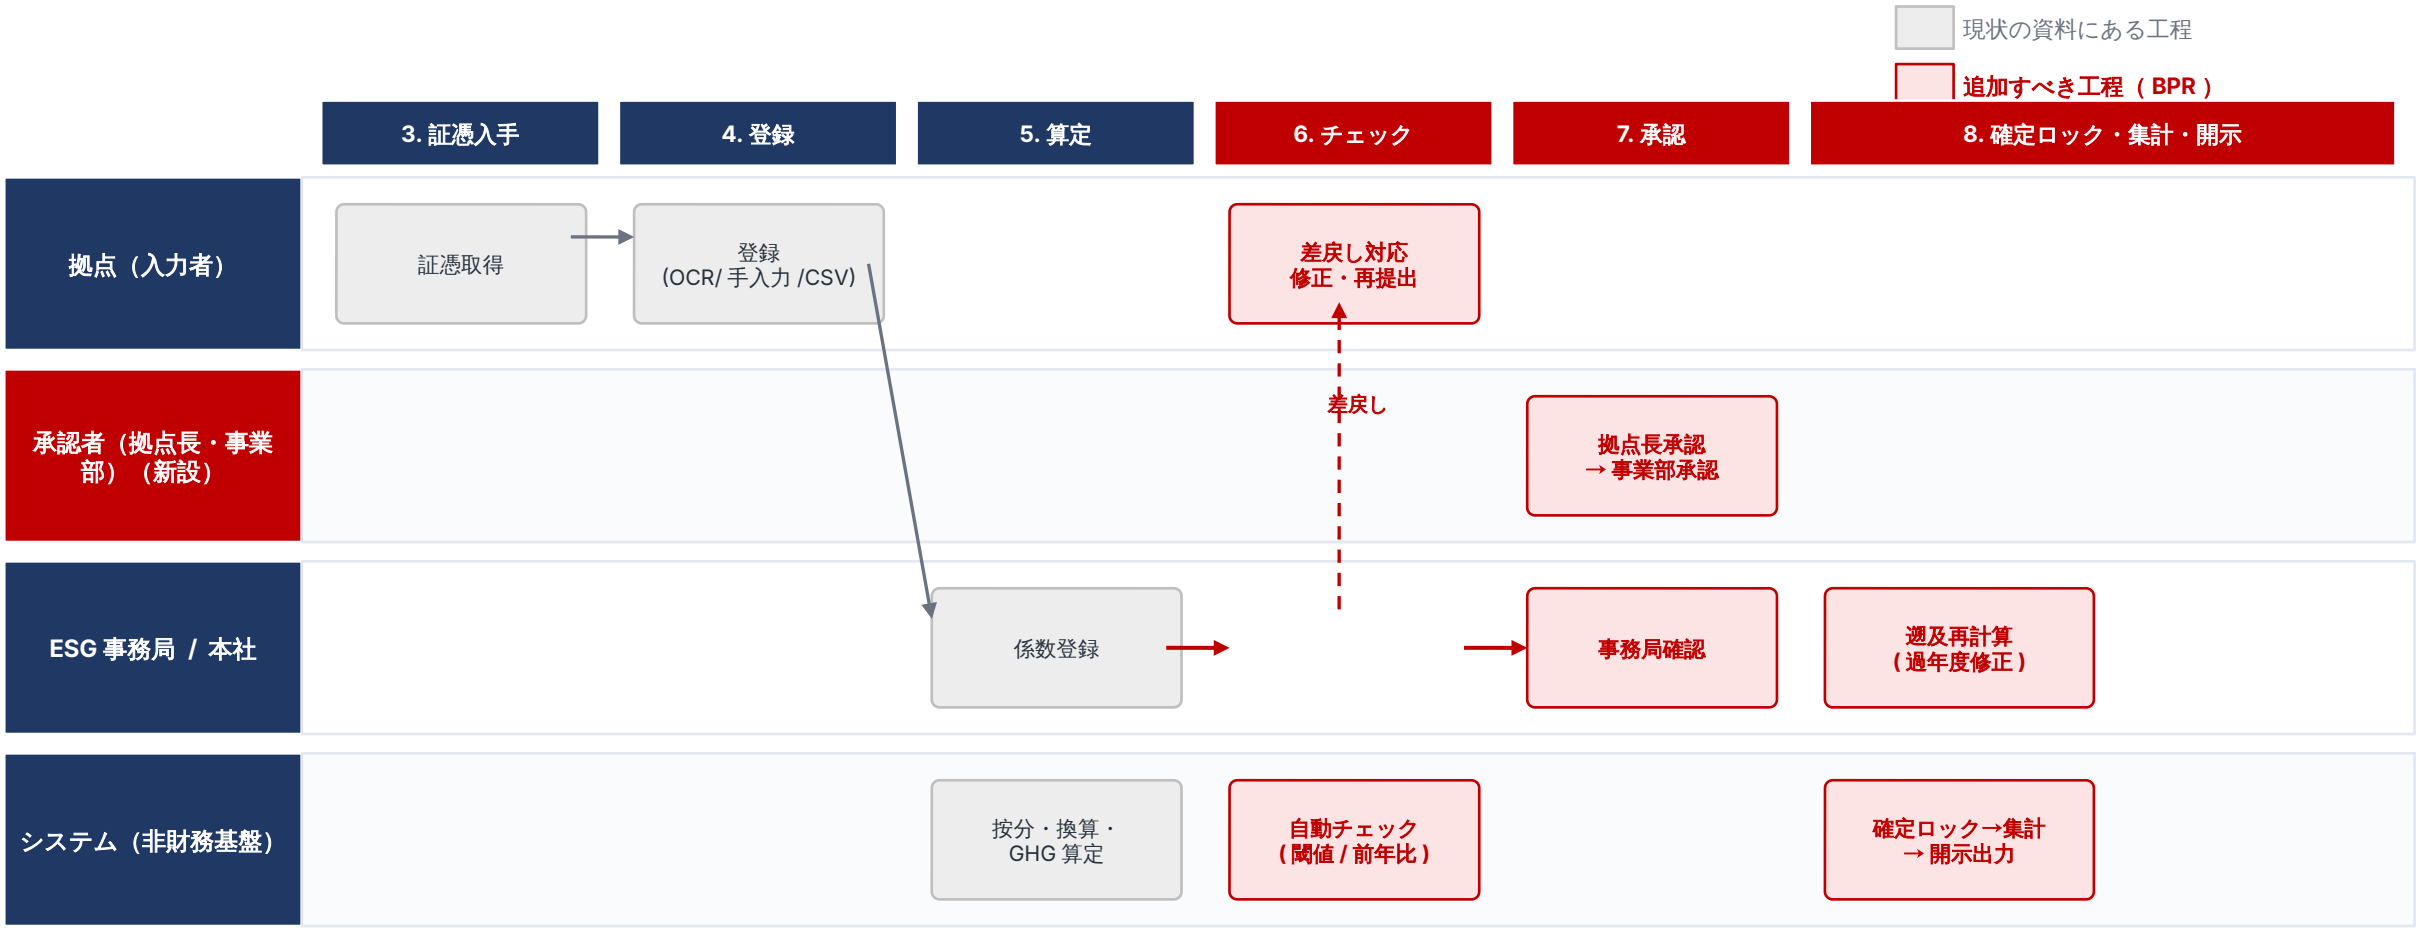

＊承認者レーン・６～８の工程・差戻しループ・遡及再計算を追加することで、A-1～A-3 を一枚で解消し、STEP2 の型④・RACI ・固有リスク発生箇所の粒度を満たす。各ボックスは STEP5 でキーコントロール・証跡要件を乗せる土台になる。

推奨アクション

STEP2 内で手当てすべき芯（1〜5）と、本日意見を返すべき論点（6〜7）

1	**承認・チェック・確定ロックをフローに内包** 各フローに統制工程とレーンを追加（A-1）	STEP2
2	**例外・差戻しパスを標準設計** 締切超過・係数欠落・検証指摘の分岐を 1 本設計し全区分へ展開（A-2）	STEP2
3	**集計・確定・開示・遡及再計算をフロー化** 「5. 算定」で切らず型④と整合させ End-to-end を完成（A-3）	STEP2
4	**按分・推計の RACI を確定** 実行＝システム／根拠＝拠点／妥当性承認＝本社 の線引きを明示（B-1/B-2）	STEP2
5	**証憑の正本を一本化** ロック時点の正本を定め、基盤外根拠も版管理・ロック対象に（D-1/D-2）	STEP2
6	**開示タイムラインへ意見を返す** インテリム検証前提に組み替え、差戻しバッファと海外月次可否を確認（E-1/E-2）	本日
7	**効果・自動化は仮説と明示し後続へ送る** 工数定量は STEP3 、自動化範囲の線引きは STEP4 で正式評価（C-1/C-2）	STEP3-4
